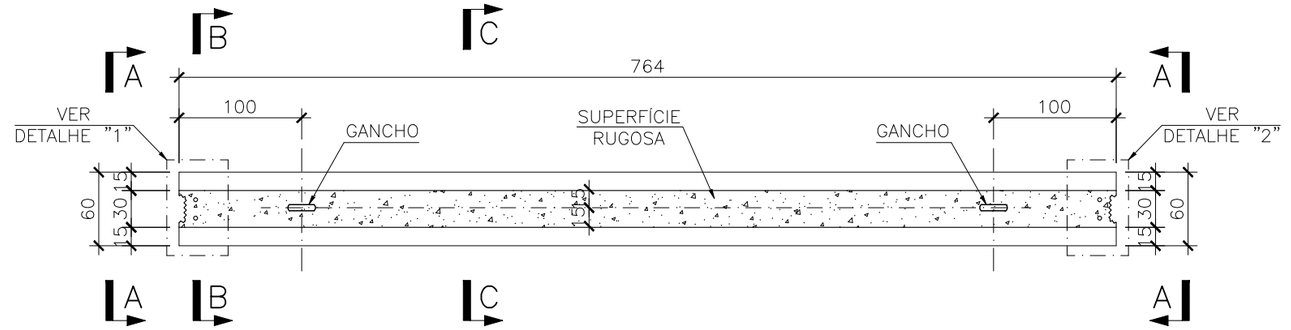

PLANTA



ELEVAÇÃO

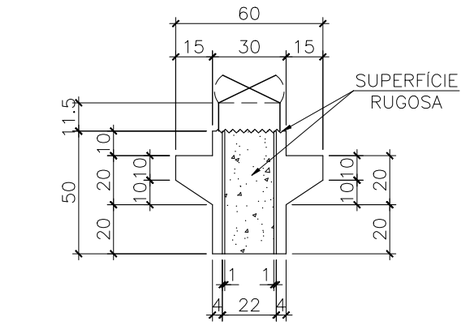

VISTA A–A

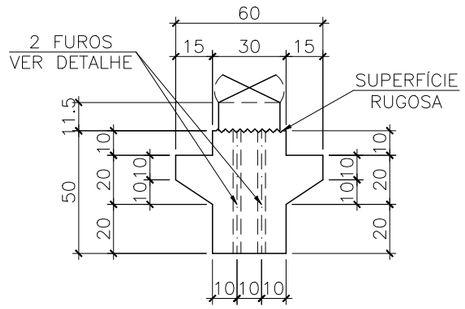

CORTE B–B

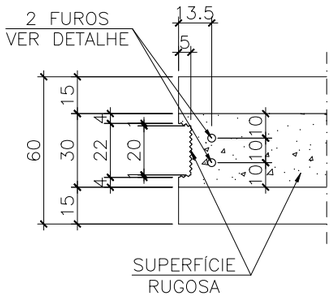

DETALHE "1"

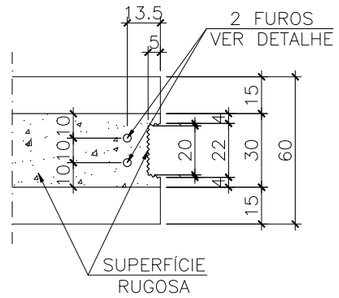

DETALHE "2"



DETALHE DO FURO

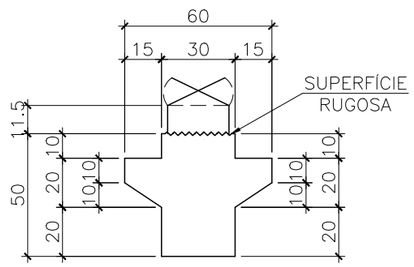

CORTE C–C

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA PRECON ENGENHARIA S/A NÃO PODENDO SER COPIADO PARCIAL OU TOTALMENTE, NEM CEDIDO A TERCEIROS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

CONFIGURAÇÕES PARA PLOTAGEM

COR	ESP.	PLOT
RED	0,1	PRETO
YELLOW	0,2	
GREEN	0,3	
CYAN	0,4	
BLUE	0,5	
MAGENTA	0,6	
255	0,1	
10 a 254	0,1	COLORIDO
	0,1	
	0,1	
	0,1	
	0,1	
	0,1	
	0,1	
	0,1	
	0,1	

NOTAS:

1–MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2–CONCRETO fck ≥ 45MPa.

3–VOLUME DE CONCRETO = 1.443 m3 ≈ 3464 Kgf.

4–PESO DA PEÇA = 3736 Kgf.

5–PARA ARMAÇÃO VER PEC024–2025–468.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	DES.	VISTO
0	15/07/2025	EMISSÃO INICIAL	ALESSANDRA	ALBA

PRECON® PRÉ-FABRICADOS

TÍTULO: FORMA VTA104(2x) 30x50x764

CLIENTE: CROMA

OBRA: EDIFICAÇÃO COMERCIAL

LOCAL: CONTAGEM – MG

DESENHO:	PROJETO:	ESCALA:
ALESSANDRA	ISNAR	S/ESCALA

CONFERIDO:	RESP. TÉCNICO/CREA:	DATA:	DESENHO Nº:	REV.	FOLHA:
ALBA	ANTÔNIO R. CABRAL CREA:16.799/D	15/07/2025	PEC024–2025–467	0	1/1

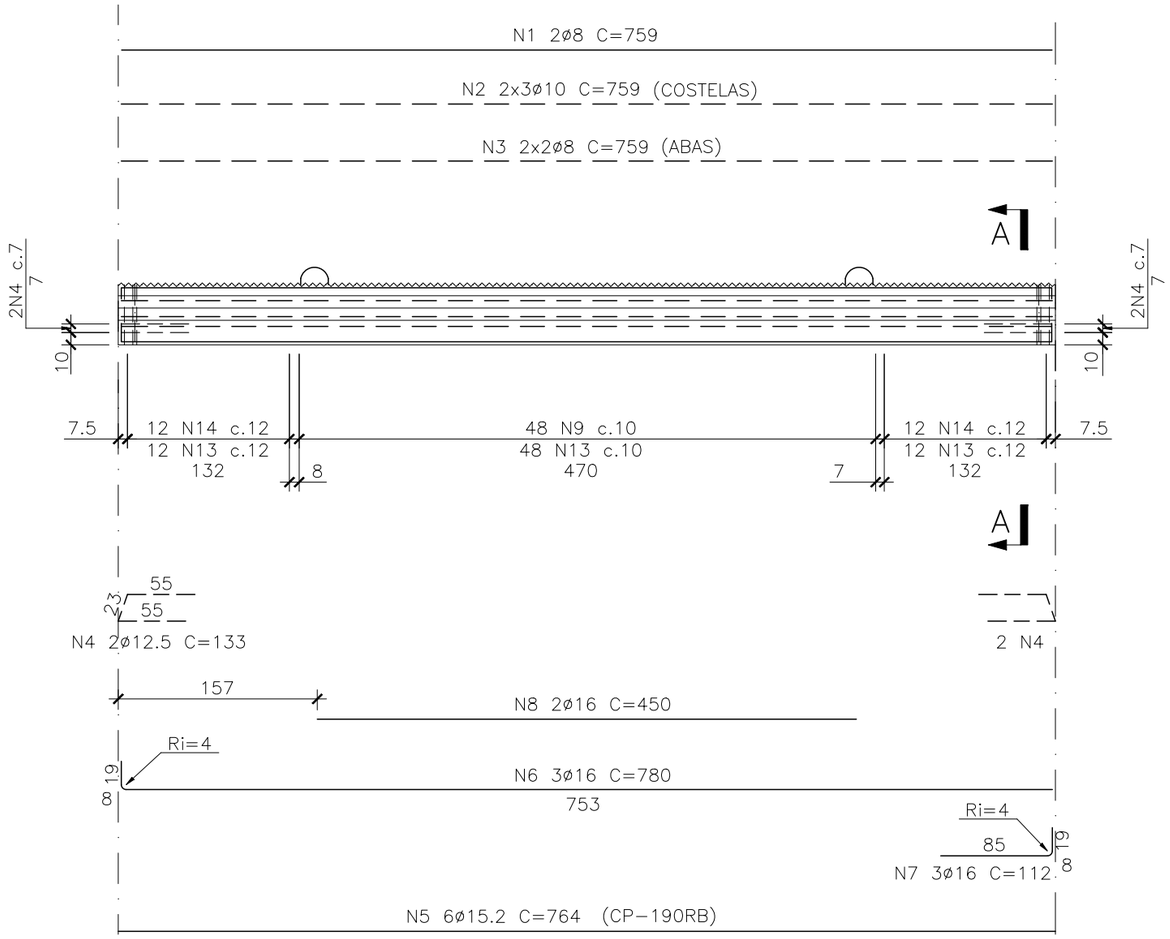

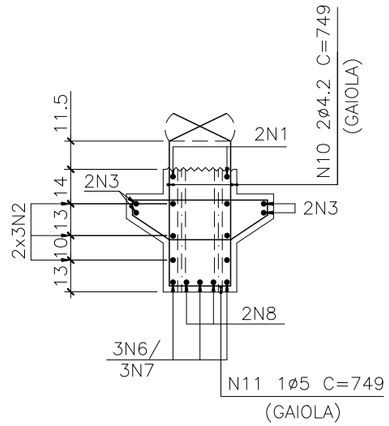

CORTE A–A



N9 48ø8.1 C=193
N14 24ø12.5 C=193



N13 72ø6 C=153

LISTA DE FERROS					
POS.	AÇO	Ø	QUANT	UNIT.	TOT.(m)
1	CA50	8	2	759	15.18
2	CA50	10	6	759	45.54
3	CA50	8	4	759	30.36
4	CA50	12.5	4	133	5.32
5	CP190RB	15.2	6	764	45.84
6	CA50	16	3	780	23.40
7	CA50	16	3	112	3.36
8	CA50	16	2	450	9.00
9	CA60	8	48	193	92.64
10	CA60	4.2	2	749	14.98
11	CA60	5	1	749	7.49
12	CP190RB	15.2	2	210	4.20
13	CA60	6	72	153	110.16
14	CA50	12.5	24	193	46.32

RESUMO DE AÇO				
TIPO	Ø	COMP.(m)	Kg/m	PESO(kg)
CA60	4.2	14.98	0.109	1.63
CA60	5.0	7.49	0.154	1.15
CA60	6.0	110.16	0.222	24.46
CA50	8.0	45.54	0.395	17.99
CA60	8.1	92.64	0.395	36.59
CA50	10.0	45.54	0.617	28.10
CA50	12.5	51.64	0.963	49.73
CP190RB	15.2	50.04	1.126	56.35
CA50	16.0	35.76	1.578	56.43
PESO TOTAL (kg)				272.42

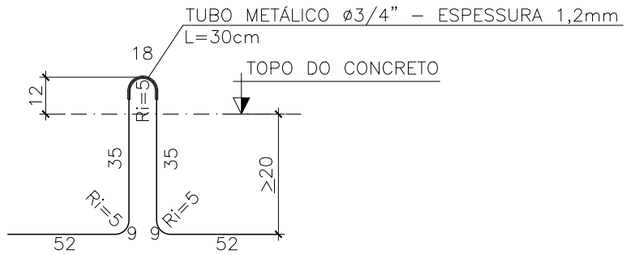

N12 2ø15.2 C=210 (CP-190RB)

DETALHE DO GANCHO



PROTENSÃO

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA PRECON ENGENHARIA S/A NÃO PODENDO SER COPIADO PARCIAL OU TOTALMENTE, NEM CEDIDO A TERCEIROS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

CONFIGURAÇÕES PARA PLOTAGEM

COR	ESP.	PLOT
RED	0,1	PRETO
YELLOW	0,2	
GREEN	0,3	
CYAN	0,4	
BLUE	0,5	
MAGENTA	0,6	
255	0,1	
10 a 254	0,1	COLORIDO
	0,1	
	0,1	
	0,1	
	0,1	
	0,1	
	0,1	
	0,1	

NOTAS:
1–MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETROS.
2–CONCRETO fck ≥ 45 MPa.
3–VOLUME DE CONCRETO = 1.443 m3 ? 3464 Kgf.
4–PESO DA PEÇA = 3736 Kgf.
5–LIBERAÇÃO P/ DESFORMA fcj ≥ – MPa.
6–FORÇA DE PROTENSÃO P/ ø 15.2 = 20,3 t/c.
7–LIBERAÇÃO DA PROTENSÃO fcj ≥ 27 MPa.
8–COBRIMENTO DA ARMAÇÃO = 2.5 cm.
9–COMPLEXIDADE = –

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	DES.	VISTO
0	15/07/2025	EMISSÃO INICIAL	ALESSANDRA	ALBA

PRECON® PRÉ-FABRICADOS

TÍTULO: ARMAÇÃO VTA104(2x) 30x50x764

CLIENTE: CROMA

OBRA: EDIFICAÇÃO COMERCIAL
LOCAL: CONTAGEM – MG

DESENHO:	PROJETO:	ESCALA:
ALESSANDRA	ISNAR	S/ESCALA

CONFERIDO:	RESP. TÉCNICO/CREA:	DATA:	DESENHO Nº:	REV.	FOLHA:
ALBA	ANTÔNIO R. CABRAL CREA:16.799/D	15/07/2025	PEC024-2025-468	0	1/1
